



Coordination de projet

Plan

- ☐ Qu'est-ce qu'un projet ?
- ☐ Quels sont les acteurs d'un projet ?
- ☐ Quelles sont les contraintes d'un projet ?
- ☐ Quelle démarche doit-on adopter ?
- ☐ Quelles sont les techniques de planification ?
- ☐ Quels sont les modèles de cycles de vie les plus courants ?
- ☐ Quels sont les risques de dysfonctionnement et comment y faire face ?

Qu'est-ce qu'un projet ?



Qu'est-ce qu'un projet ?

- ➡ ISO (organisation internationale de normalisation) :
- ➡ « un processus unique, qui consiste en un **ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées** comportant des **dates de début et de fin**, entrepris dans le but d'atteindre un **objectif** conforme à des exigences spécifiques telles que des contraintes de **délais**, de **coûts** et de **ressources** »
- ➡ Il existe plusieurs autres définitions provenant d'organismes officiels, qui vont globalement toutes dans le même sens.

Quels sont les acteurs d'un projet ?

Projet Management Crash & Burn 101

Create your own cartoon at www.projectcartoon.com



How the customer explained it



How the project leader understood it



How the analyst designed it



How the programmer wrote it



What the beta testers received



How the business consultant described it




How the project was documented



What operations installed



How the customer was billed



How it was supported




What marketing advertised



When it was delivered




What the customer really needed




What the digg effect can do to your site



The disaster recover plan



What the customer really needed




What the digg effect can do to your site



The disaster recover plan

Quels sont les acteurs d'un projet ?

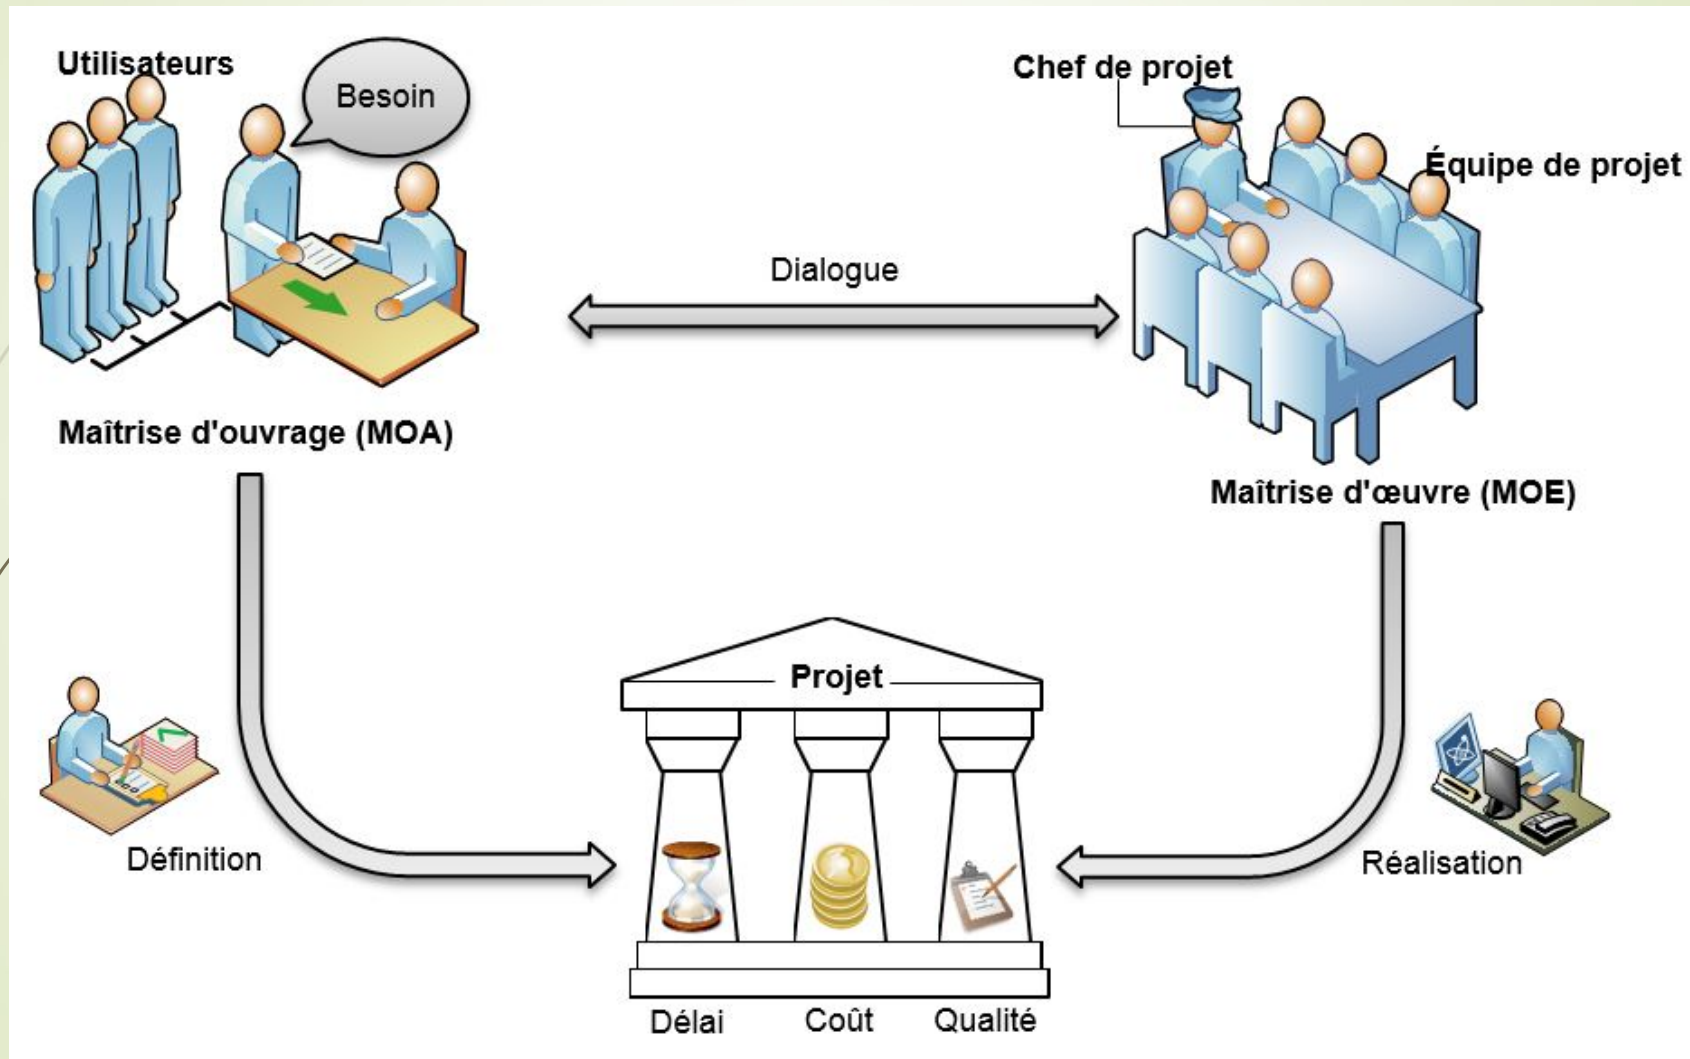

Quels sont les acteurs d'un projet ?

➡ La maîtrise d'ouvrage (MOA) :

- ➡ c'est la personne morale qui sera **propriétaire de l'ouvrage**

➡ Les utilisateurs :

- ➡ ce sont les **destinataires finaux** de la solution

➡ La maîtrise d'œuvre (MOE) :

- ➡ la personne physique ou morale qui **réalise techniquement le projet** pour le compte de la MOA

Quels sont les acteurs d'un projet ?

➡ Le chef de projet :

- ➡ c'est la personne physique qui **représente la MOE**

➡ L'équipe de projet :

- ➡ ce sont les personnes physiques qui **vont réaliser le projet**

Quelles sont les contraintes d'un projet ?



Quels sont les contraintes d'un projet ?

■ La qualité :

- satisfaire les besoins définis par les utilisateurs.
- qualité des processus de réalisation du produit.

Quels sont les contraintes d'un projet ?

- La qualité :
- Le délai :
 - l'ordonnancement des tâches,
 - les durées prévues,
 - ainsi que les jalons (fin d'une étape)


Quels sont les contraintes d'un projet ?

- La qualité :
- Le délai :
- Le coût :
 - Maîtrise du coût ("coûtenance") avec une gestion de pilotage des coûts.

Quels sont les contraintes d'un projet ?

- ➡ La qualité :
- ➡ Le délai :
- ➡ Le coût :
- ➡ Les autres contraintes :
 - ➡ juridique (respect de la vie privée, propriété intellectuelle...)
 - ➡ éthiques (développement durable)
 - ➡ technologiques (technologies mobiles, cloud-computing...)


Quelle démarche doit-on adopter ?

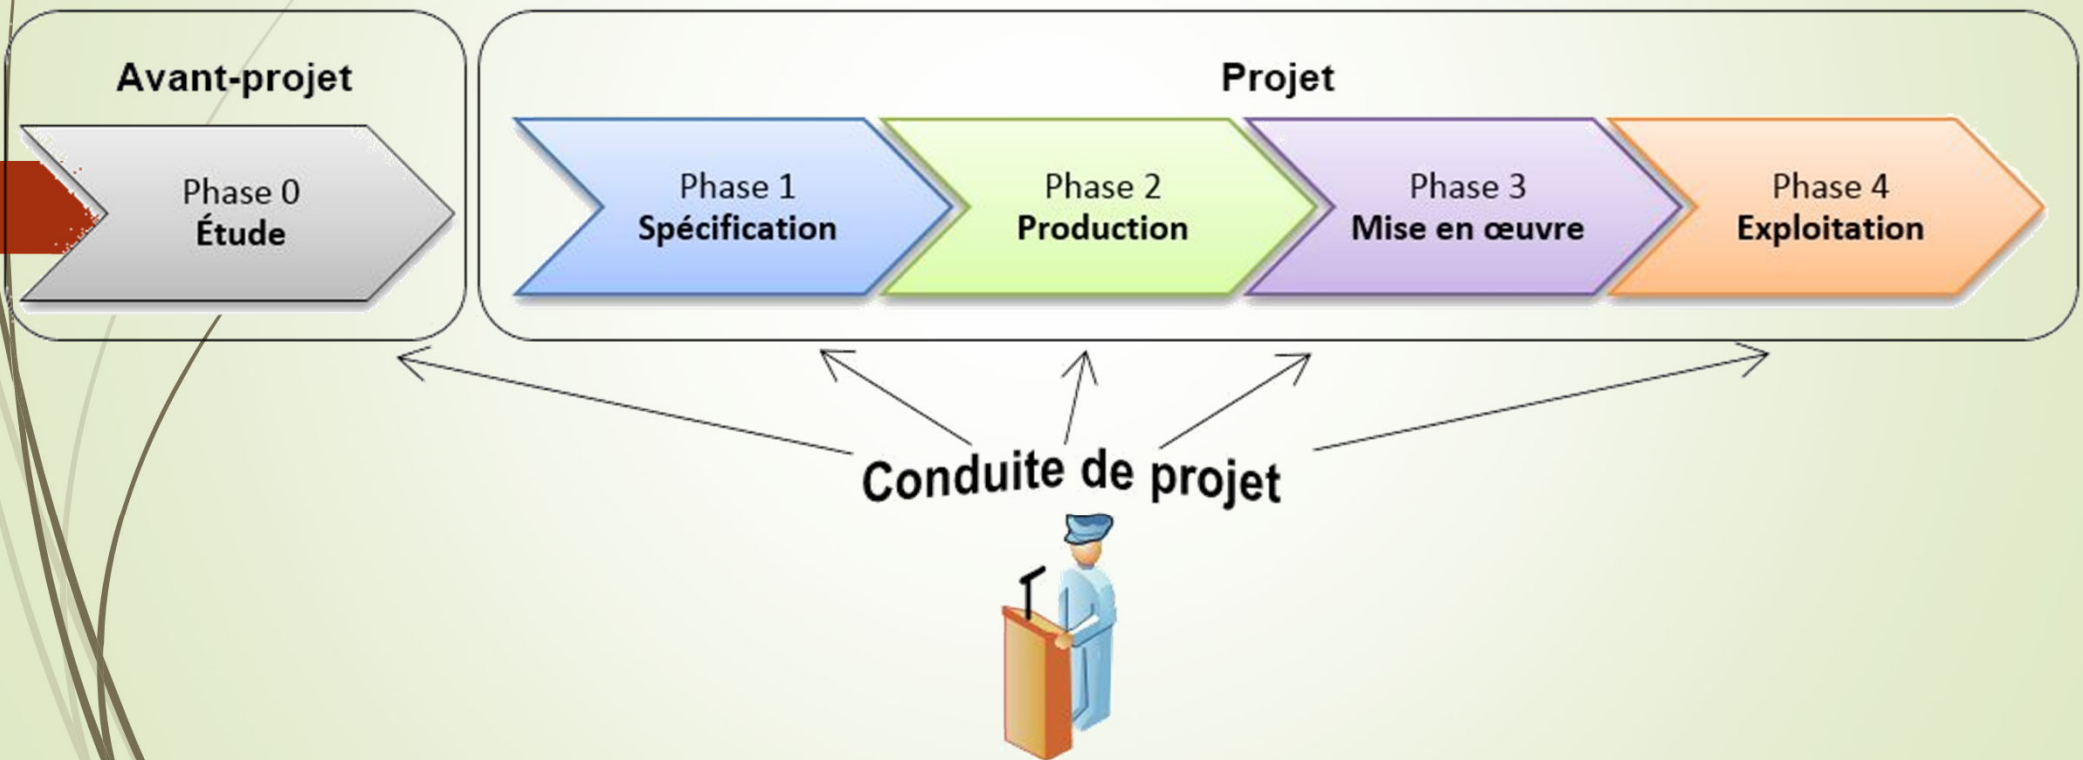


Quelle démarche doit-on adopter ?



➡ Phase 0 : Étude

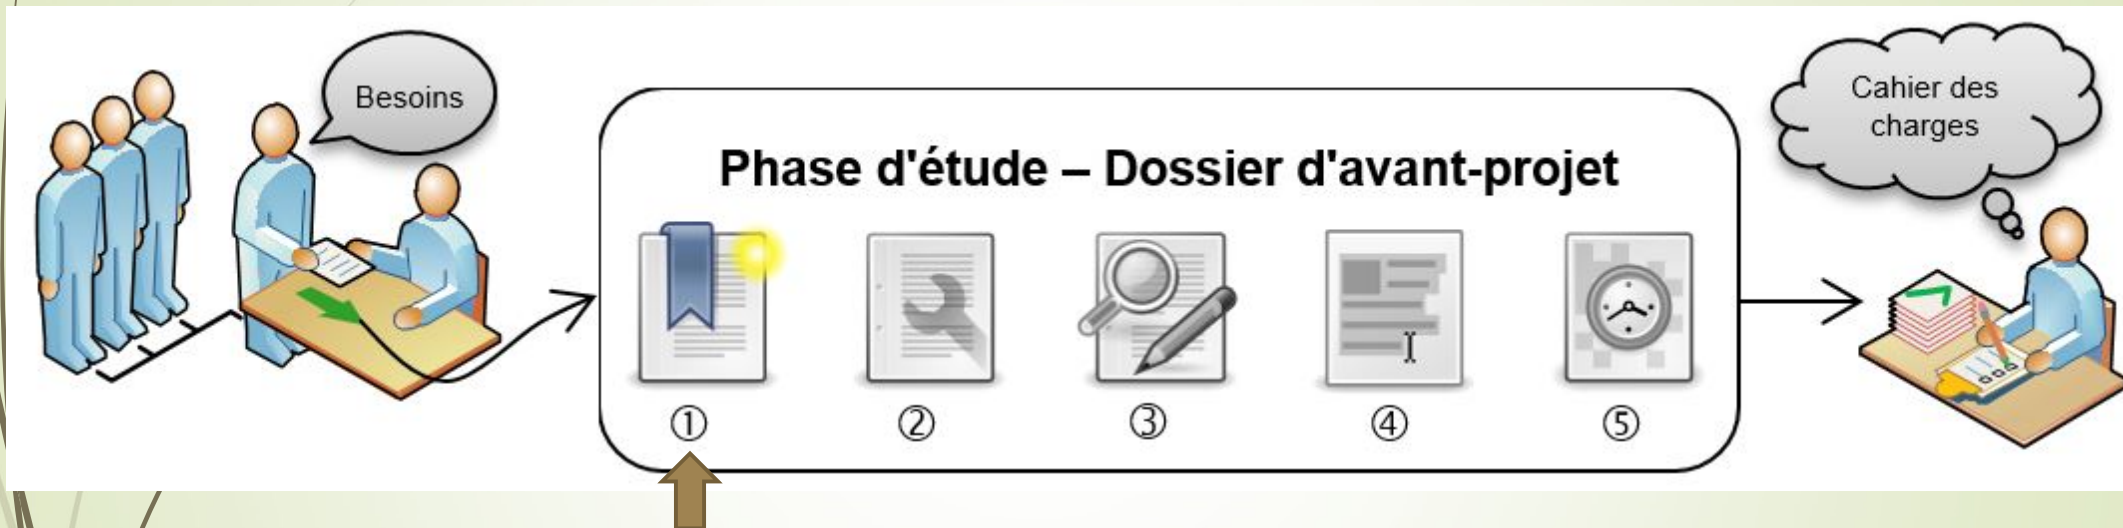


① **L'étude d'opportunité** qui permet à la MOA de juger s'il est **opportun** de réaliser le projet dans le contexte "actuel", c'est-à-dire au regard du **besoin** et du **budget** disponible.



Quelle démarche doit-on adopter ?


➔ Phase 0 : Étude

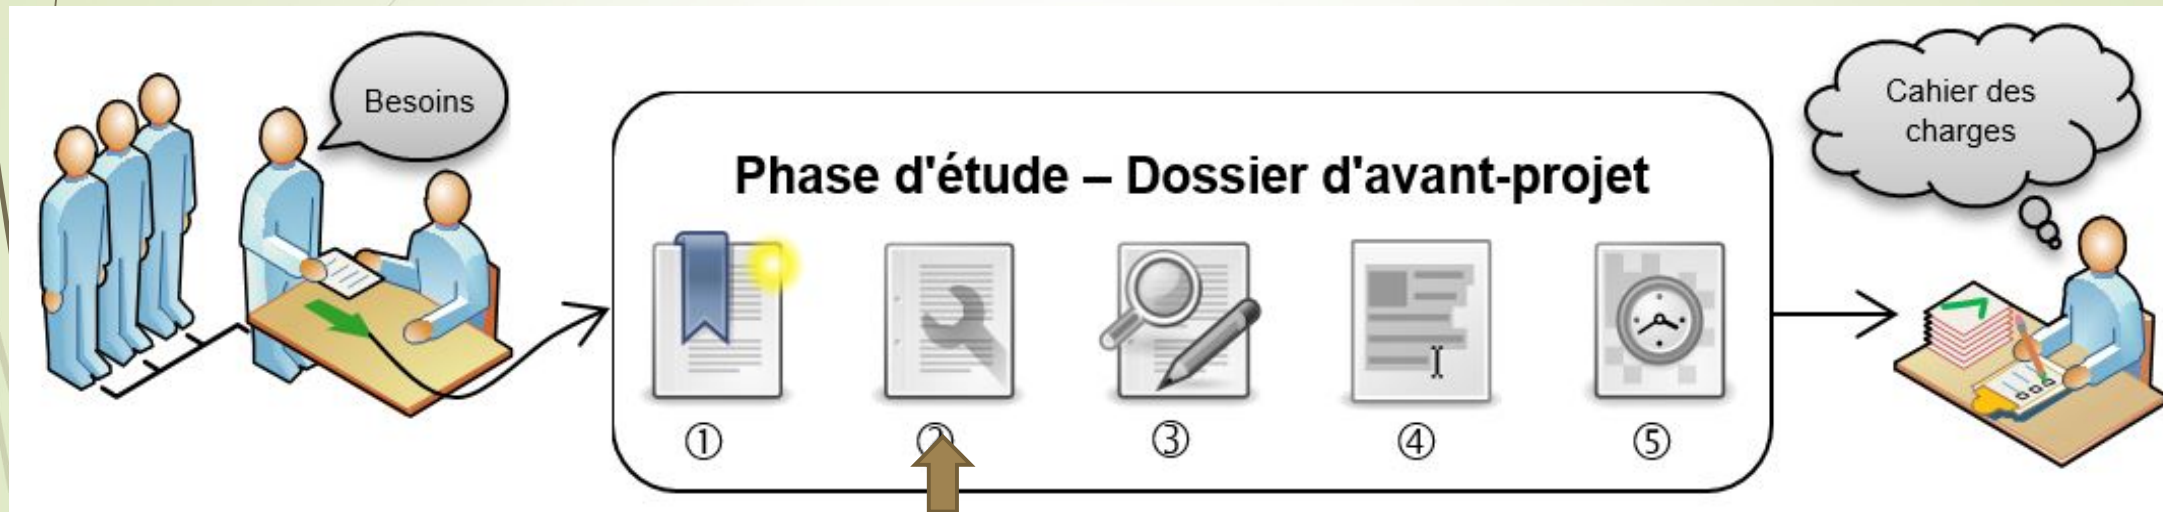

② **L'étude de faisabilité technique** qui permet à la MOA de prendre connaissance des différents **impacts techniques, organisationnels et financiers** du projet, c'est-à-dire si le projet semble en l'état actuel "réalisable" sans risques pour l'entreprise.

Quelle démarche doit-on adopter ?

□ Phase 0 : Étude

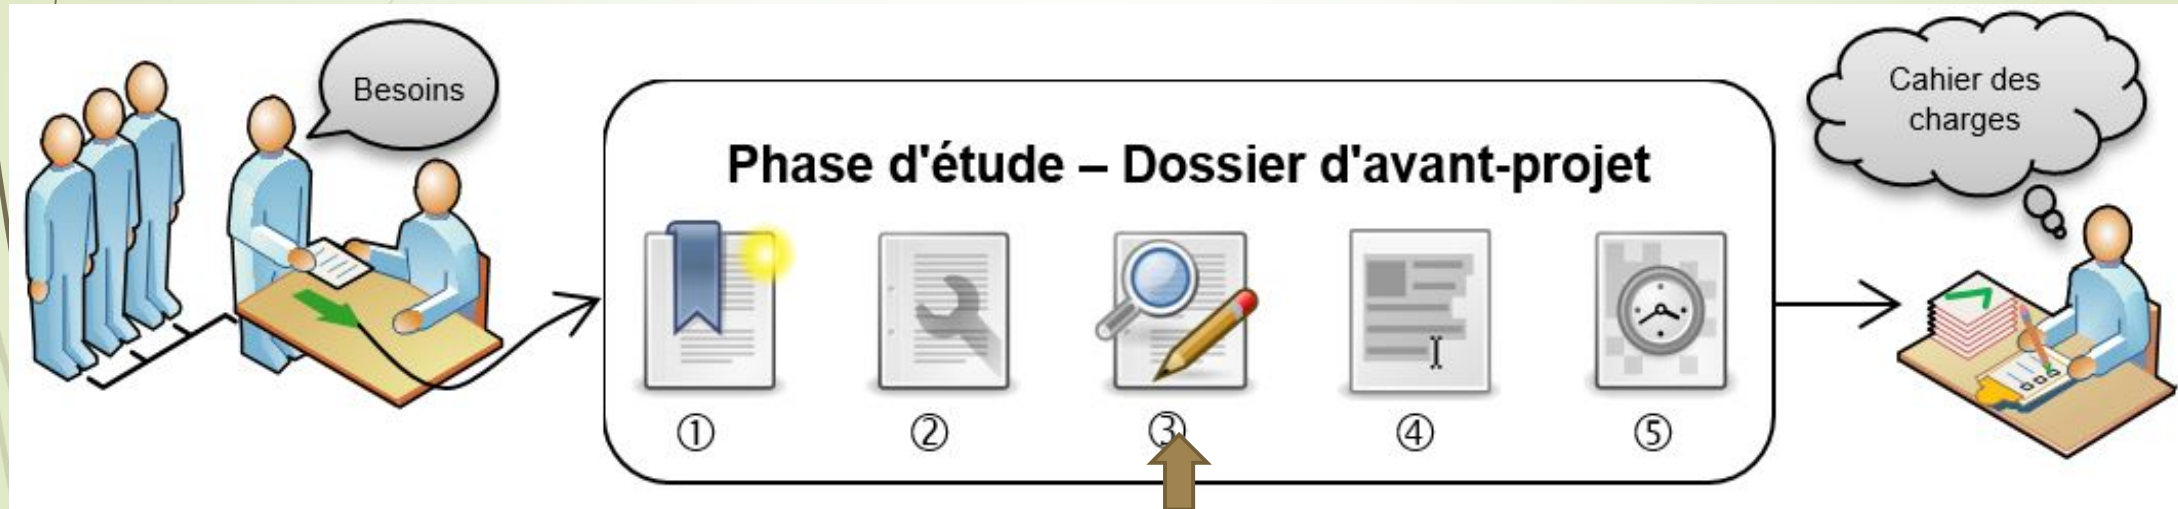


③ Analyse de l'existant (Q.Q.O.Q.C.C.P)

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?

Quelle démarche doit-on adopter ?

□ Phase 0 : Étude

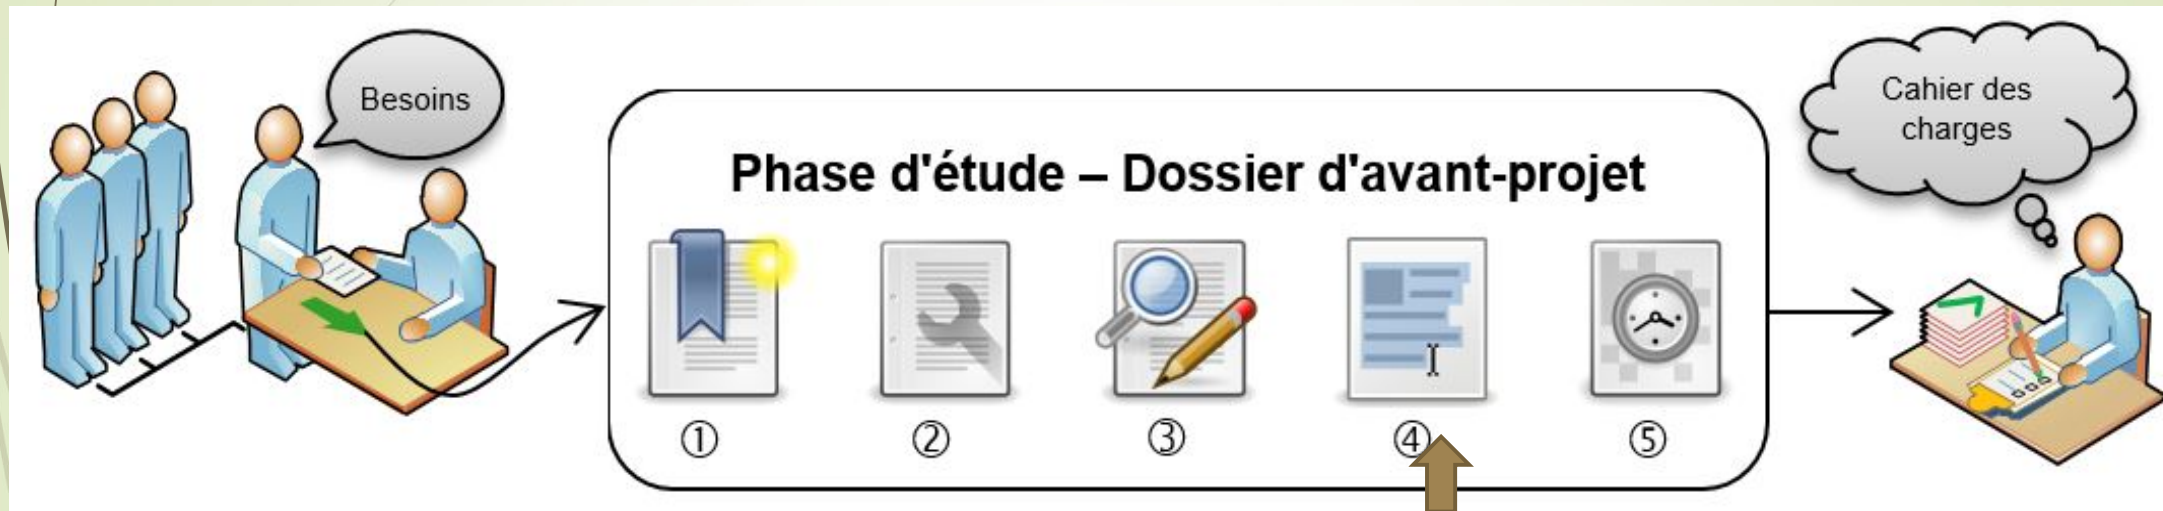


④ Une proposition de solutions

moyens humains, matériels et financiers à mettre en œuvre, modalités de contrôles, justifications techniques et économiques des solutions...

Quelle démarche doit-on adopter ?

□ Phase 0 : Étude

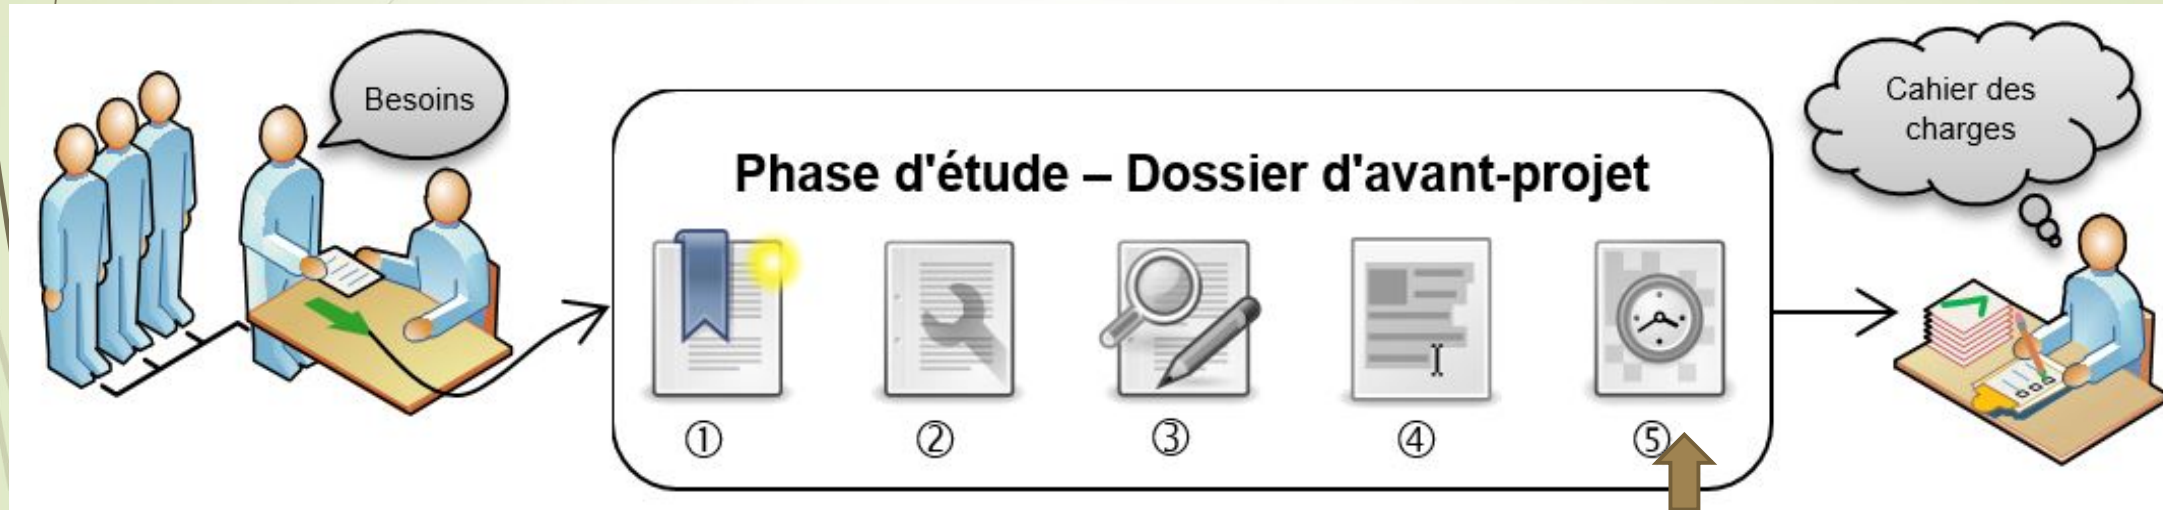

⑤ Un planning prévisionnel

moyens prévus, contraintes (début, fin et simultanéité de tâches)...

Quelle démarche doit-on adopter ?



➡ Phase 0 : Étude



Le cahier des charges doit être clair, concis et le plus simple possible.

Le cahier des charges est irréversible et constitue un **contrat** entre la MOA et la MOE, ce qui signifie que les deux parties s'engagent à s'y conformer.



Quelle démarche doit-on adopter ?

➡ Phase 0 : Étude



Phase d'étude – Dossier d'avant-projet
Plan type d'un cahier des charges :


Norme NF X50-151
de l'AFNOR



Quelle démarche doit-on adopter ?



➡ Phase 1 : Spécification

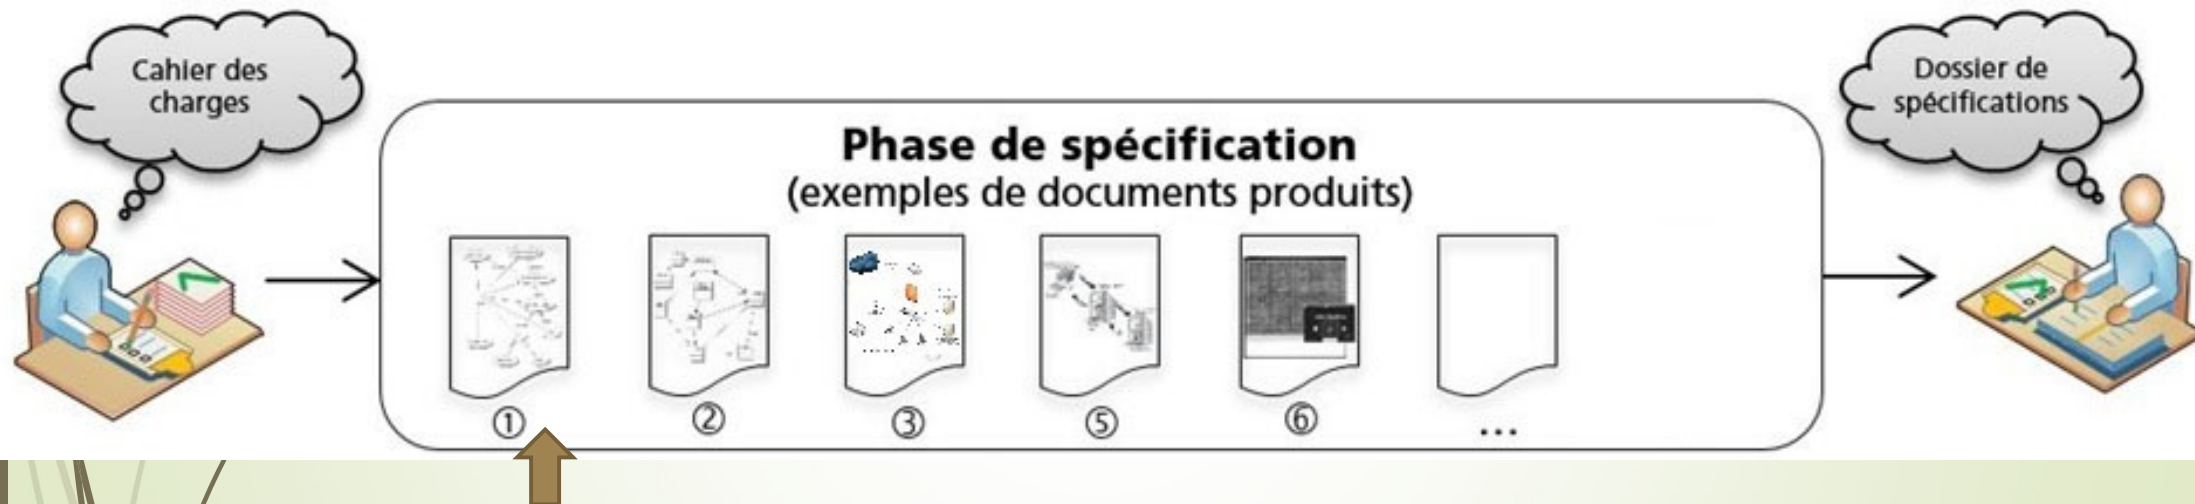


① Le diagramme de cas d'utilisation

Quelle démarche doit-on adopter ?



➡ Phase 1 : Spécification

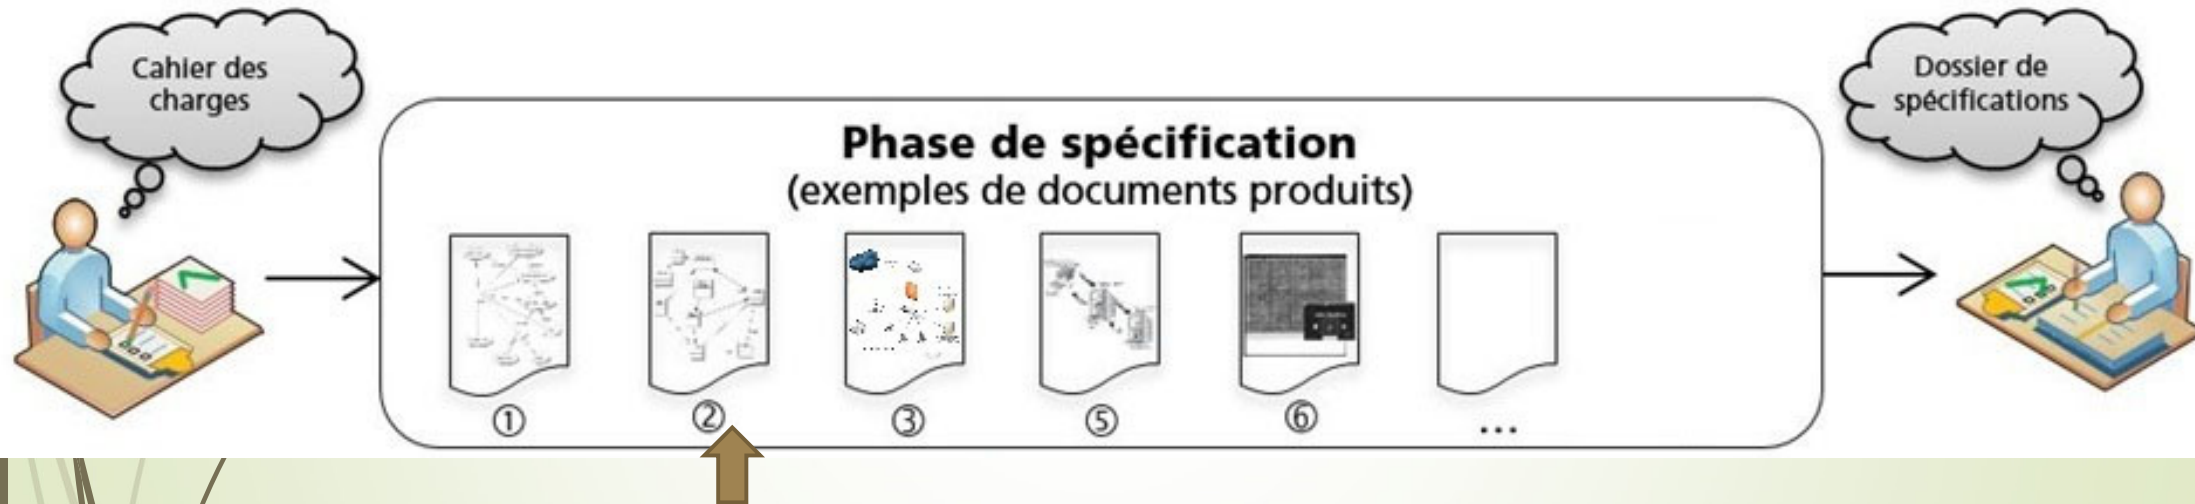


② Le diagramme de classes

Quelle démarche doit-on adopter ?



➡ Phase 1 : Spécification

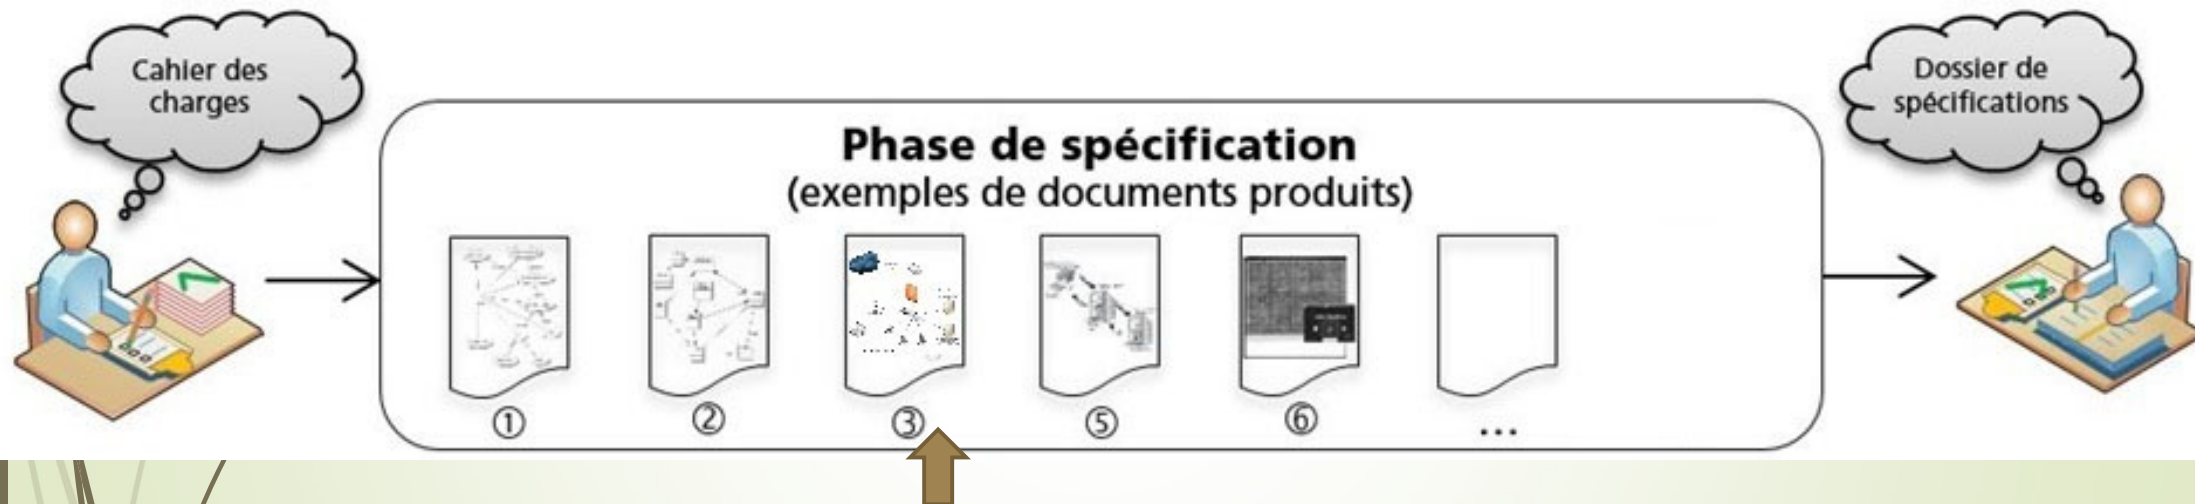


③ Le schéma du réseau

Quelle démarche doit-on adopter ?




➡ Phase 1 : Spécification

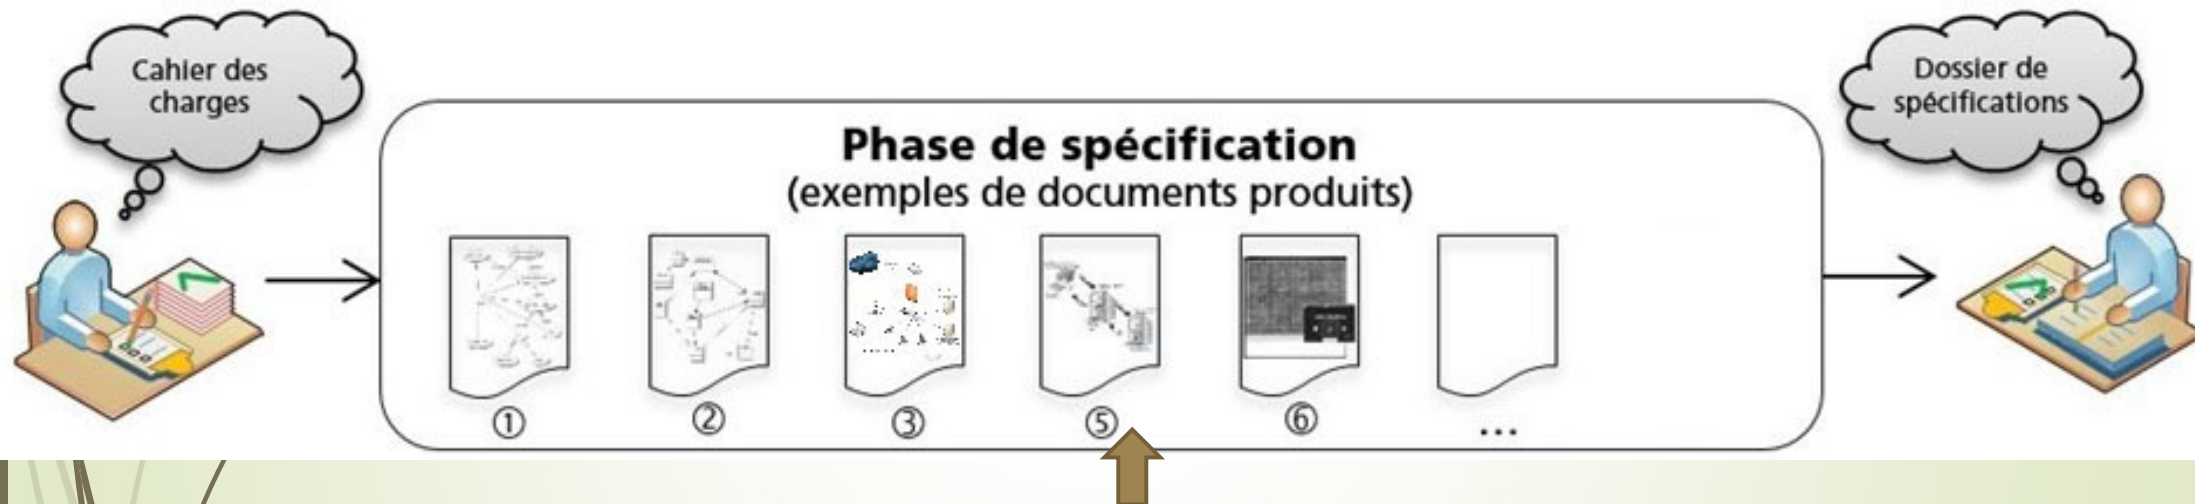


④ L'architecture fonctionnelle et l'architecture physique

Quelle démarche doit-on adopter ?



➡ Phase 1 : Spécification

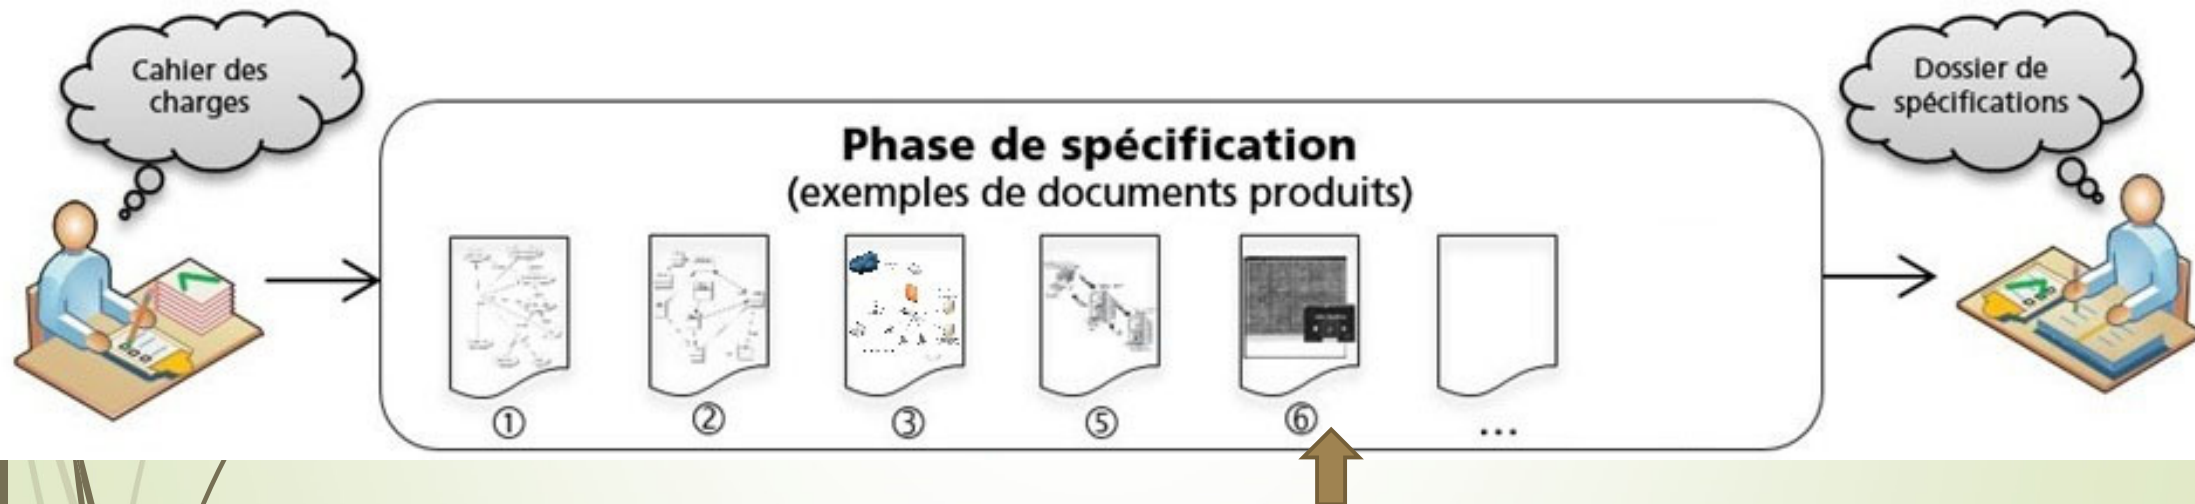


⑥ Un prototypage des interfaces graphiques

Quelle démarche doit-on adopter ?



➡ Phase 1 : Spécification

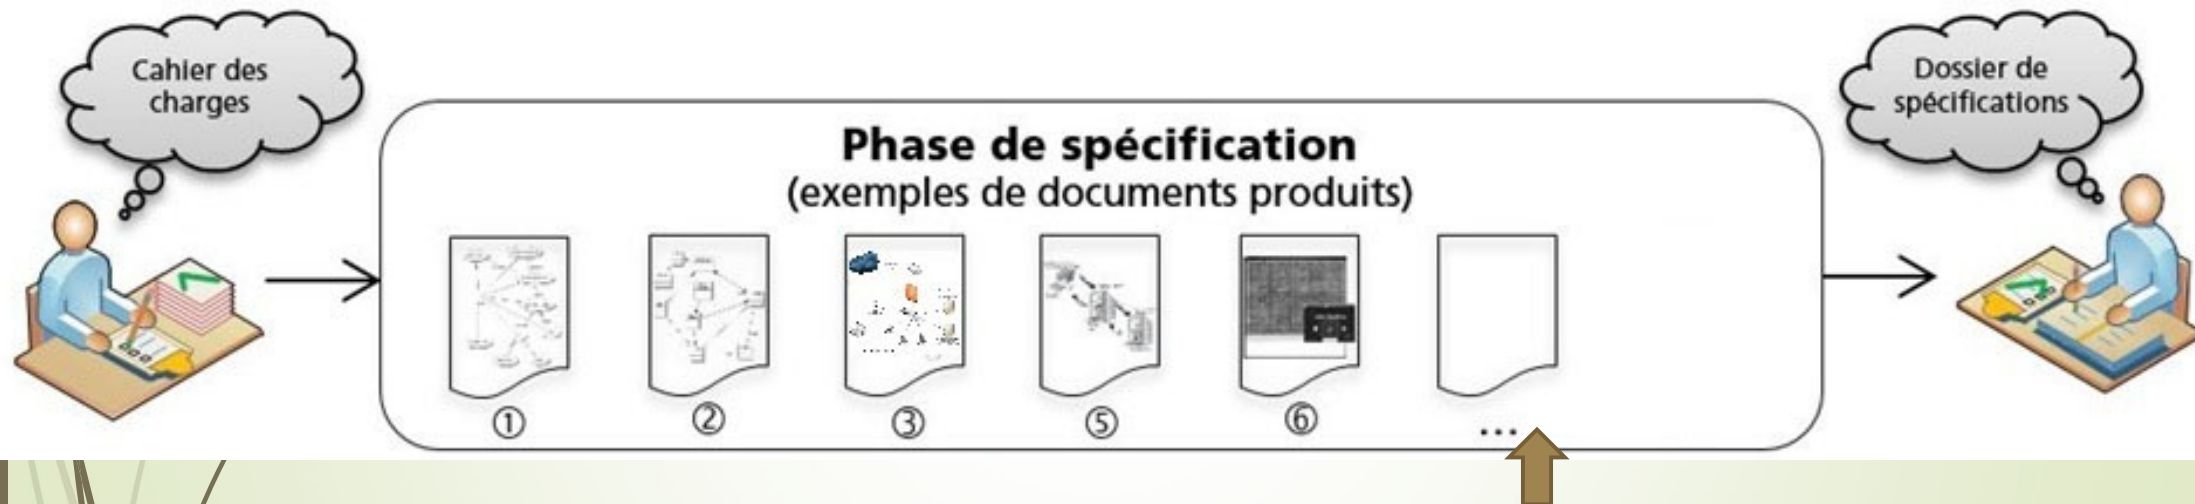

...et bien d'autres documents (**jeux d'essai...**)
+ choix techniques (langages, technologies, stratégies de répartitions, architectures...).



Quelle démarche doit-on adopter ?

➡ Phase 1 : Spécification



cahier des charges $\neq$ dossier de spécifications

"ce qu'il y a à faire"

"comment le faire"

+ choix techniques (SGBD, langages, technologies, stratégies de répartitions, architectures...).



Quelle démarche doit-on adopter ?

□ Phase 2 : Production



① Un tableau de bord de pilotage

pour suivre l'évolution d'indicateurs (sur la qualité, les coûts, les ressources humaines...)

Quelle démarche doit-on adopter ?



□ Phase 2 : Production




② Une documentation technique
destinée aux futures mises à jour



Quelle démarche doit-on adopter ?

➡ Phase 2 : Production

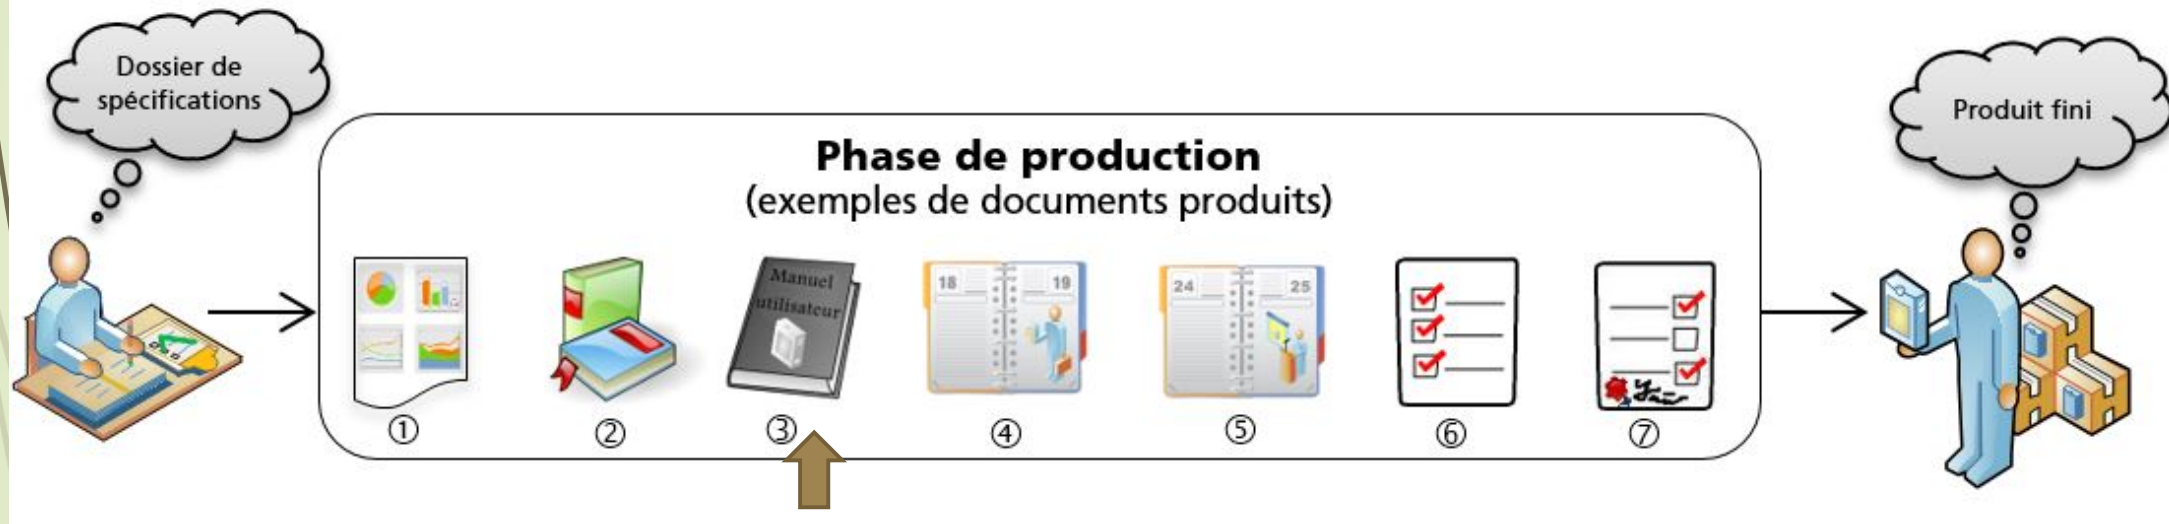

Les manuels "utilisateurs" (papier, vidéo, en ligne)

pour servir de référence lorsqu'un utilisateur souhaite retrouver un information, une procédure ou un mode opératoire.

Quelle démarche doit-on adopter ?



Phase 2 : Production



Le plan de déploiement sur les différents sites
(site "pilote" et les autres sites)

Quelle démarche doit-on adopter ?



□ Phase 2 : Production



⑤ Le plan d'accompagnement

réunions d'information, formation des utilisateurs, assistance...

Quelle démarche doit-on adopter ?



Phase 2 : Production



⑥ Le cahier de "recette usine"

comporte l'intégralité des tests effectués en interne par la MOE



Quelle démarche doit-on adopter ?

□ Phase 2 : Production



⑦ Le protocole de recette fonctionnel

tests à effectuer par la MOA

vérification d'aptitude au bon fonctionnement





Quelle démarche doit-on adopter ?

➡ Phase 3 : Mise en œuvre



site pilote puis généralisation

vérification de service régulier



Quelle démarche doit-on adopter ?




Phase 3 : Mise en œuvre



① Le cahier de recette technique

contrôle si la solution est conforme aux attentes





Quelle démarche doit-on adopter ?

□ Phase 3 : Mise en oeuvre



② La liste des correctifs apportés
suite aux remontées d'incidents



Quelle démarche doit-on adopter ?





□ Phase 3 : Mise en oeuvre



③ **Le procès-verbal d'admission**
atteste le "service fait"





Quelle démarche doit-on adopter ?

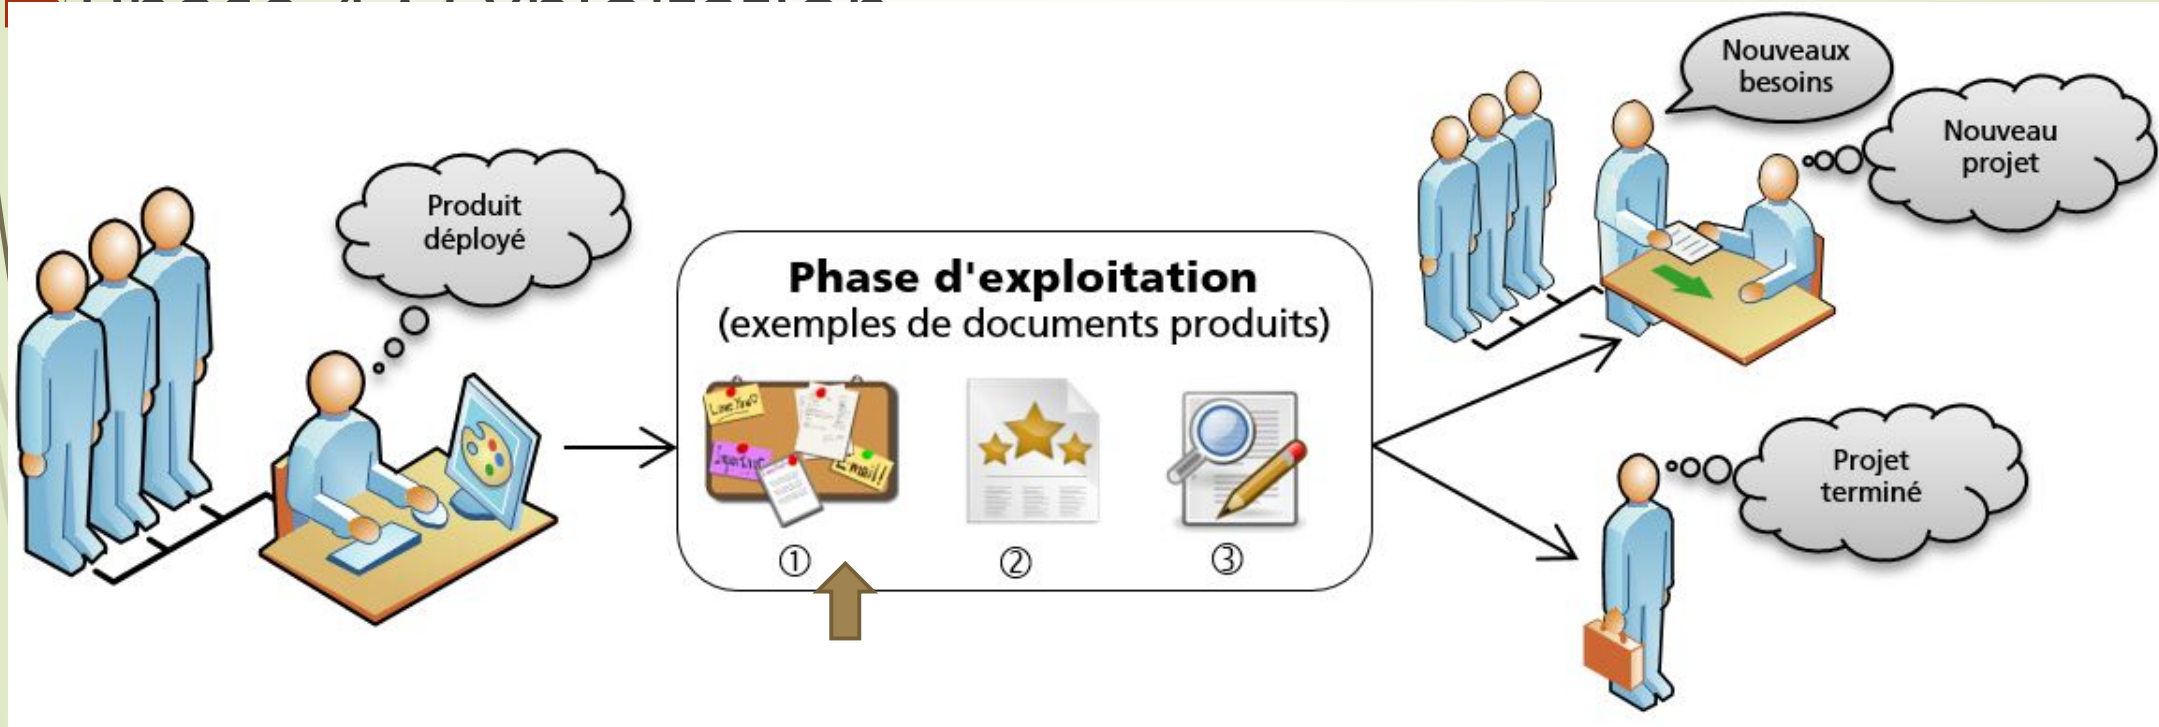



① La mise à jour de la liste des correctifs apportés

Quelle démarche doit-on adopter ?

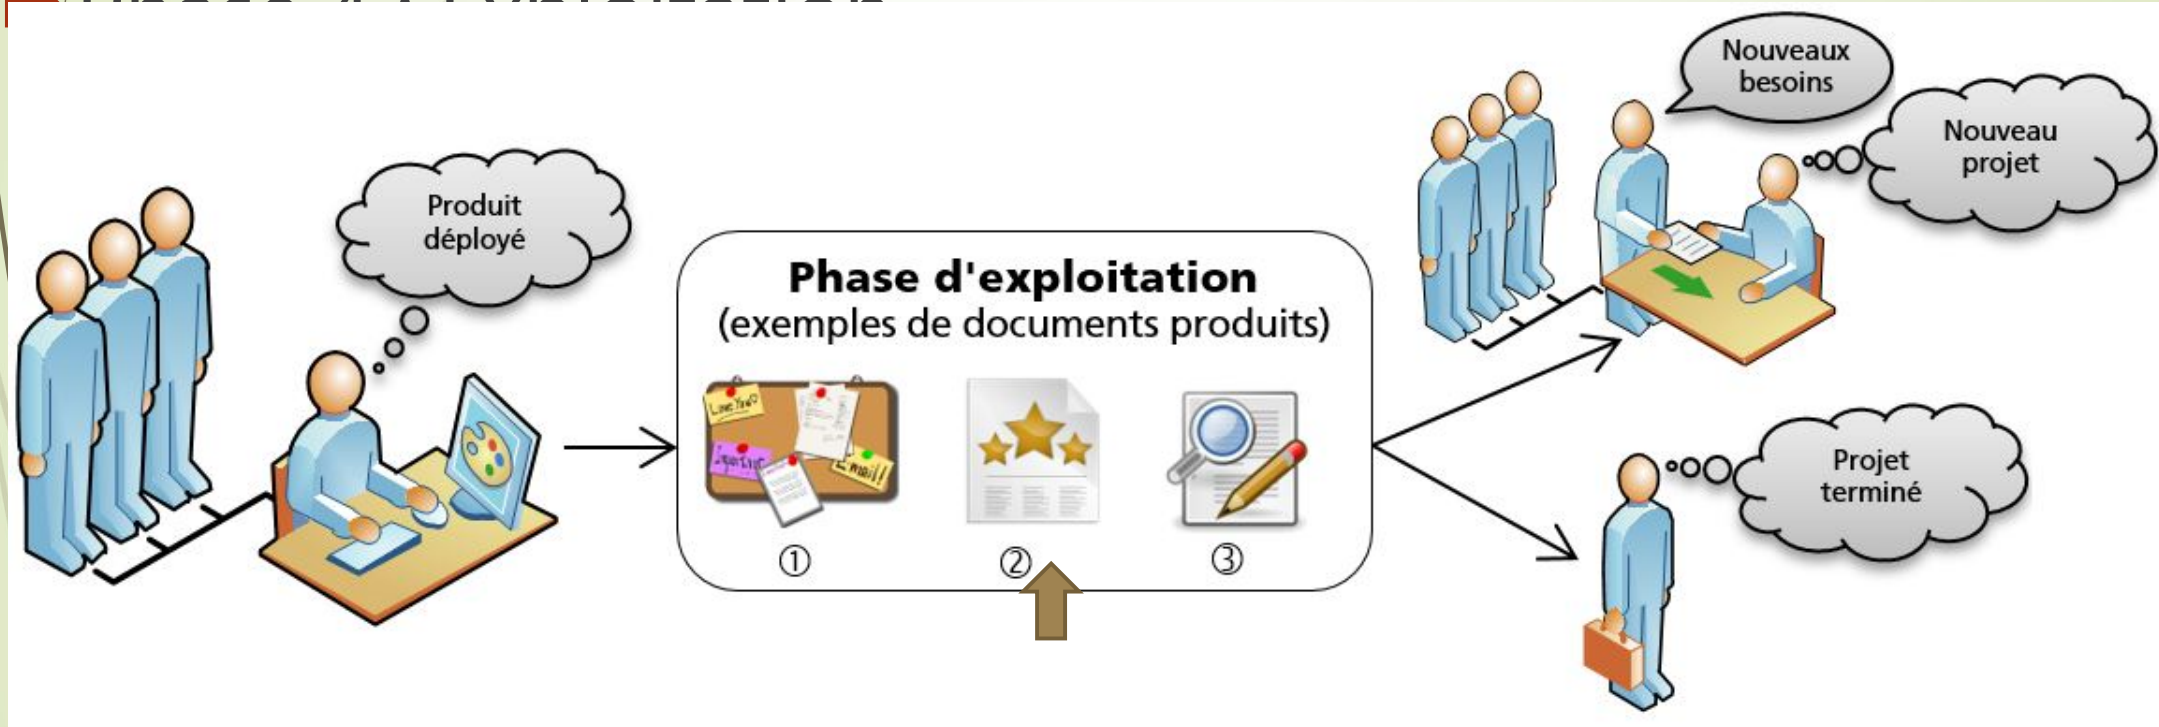


② Un bilan de projet

Quelle démarche doit-on adopter ?

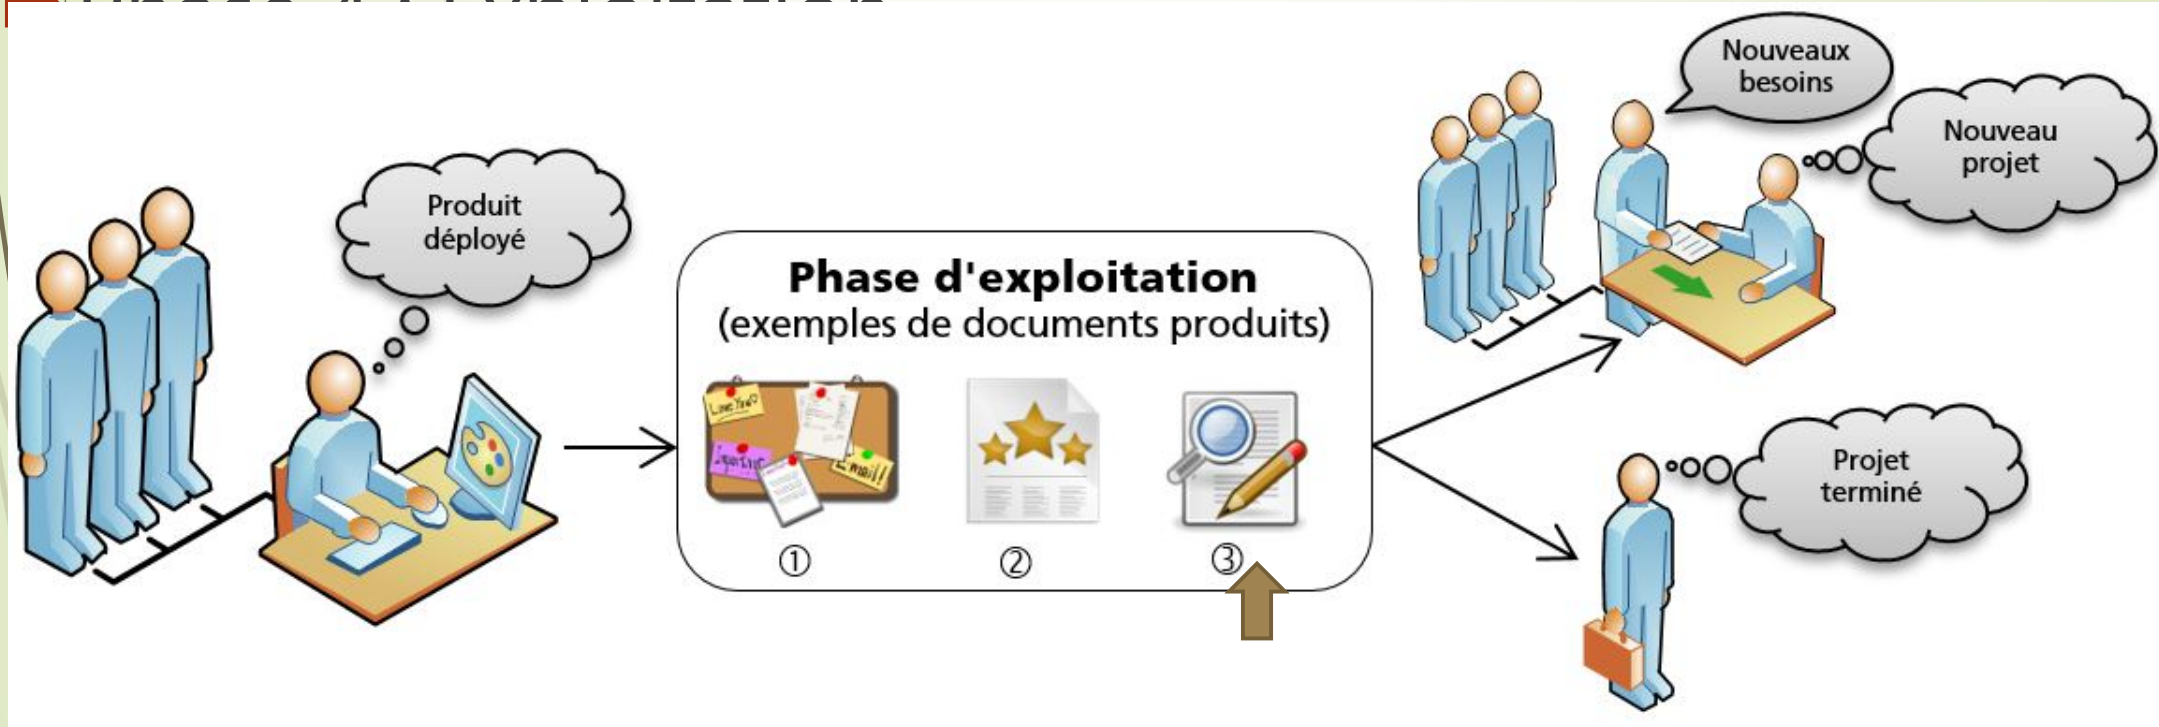

③ Une liste de possibilités d'évolution

Quelle démarche doit-on adopter ?




➤ Indicateurs de réussite d'un projet :

- ❑ D'un point de vue managérial, c'est un projet qui respecte ses contraintes (coûts et délais), qui met en place une solution efficace qui améliore les performances d'une organisation et plus globalement, qui crée de la valeur ;



Quelle démarche doit-on adopter ?




☐ Indicateurs de réussite d'un projet :

☐ D'un point de vue managérial

☐ D'un point de vue technique, c'est un projet dont les concepteurs ont su s'approprier le métier des utilisateurs grâce à un langage commun ;



Quelle démarche doit-on adopter ?



☐ Indicateurs de réussite d'un projet :

☐ D'un point de vue managérial

☐ D'un point de vue technique

☐ **D'un point de vue relationnel, c'est un projet dont la qualité et l'étendue comblient pleinement les désirs des utilisateurs grâce à des échanges intelligents MOA/MOE tout au long du cycle de vie.**

